



## COMUNE di MIRA (VE)

REALIZZAZIONE DI PALESTRA ALL'APERTO presso  
SCUOLA PRIMARIA "E. De Amicis" DI MARANO (VE)  
PROGETTO DEF./ESECUTIVO

DATA

20.11.2017

committente: Comune di MIRA

CRONOPROGRAMMA


ELABORATO

F




Enzo De Zan | *Geometra*  
Francesca Ruzzene | *Architetto*

Studio Associato di Progettazione | via Fioretti, n.4 - 31020 San Fior (TV)  
Tel +39 0438 777800 Fax +39 0438 478 876



| ID | Nome attività                        | Durata | Importo   | Marzo 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|--------------------------------------|--------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                                      |        |           | 01         | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1  | Lavori a CORPO                       | 44 g   | 75'212,12 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | ALLESTIMENTO DEL CANTIERE            | 7 g    | 0,00      |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | Allestimenti vari                    | 7 g    | 0,00      |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | DEMOLIZIONI                          | 3 g    | 12'192,00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI        | 3 g    | 12'192,00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | SCAVI - RILEVATI                     | 7 g    | 9'622,70  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | SCAVO DI SBANCAMENTO                 | 2 g    | 1'598,40  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8  | RIPORTI IN MATERIALE                 | 5 g    | 8'024,30  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9  | VARIE                                | 11 g   | 5'352,42  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 | FORMAZIONE CORDOLO, PUNTO IN C.A.    | 7 g    | 4'501,02  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | TAPPETO ERBOSO                       | 2 g    | 851,40    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | PAVIMENTAZIONI                       | 8 g    | 45'145,00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO       | 2 g    | 24'169,00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 | RIVESTIMENTO ELASTICO PAVIMENTAZIONI | 4 g    | 20'976,00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15 | SEGNALETICA                          | 1 g    | 2'900,00  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | SEGNALETICA                          | 1 g    | 2'900,00  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17 | SMOBILIZZO DEL CANTIERE              | 2 g    | 0,00      |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18 | Chiusura cantiere                    | 2 g    | 0,00      |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                                      |        |           |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                                      |        |           |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                                      |        |           |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                                      |        |           |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

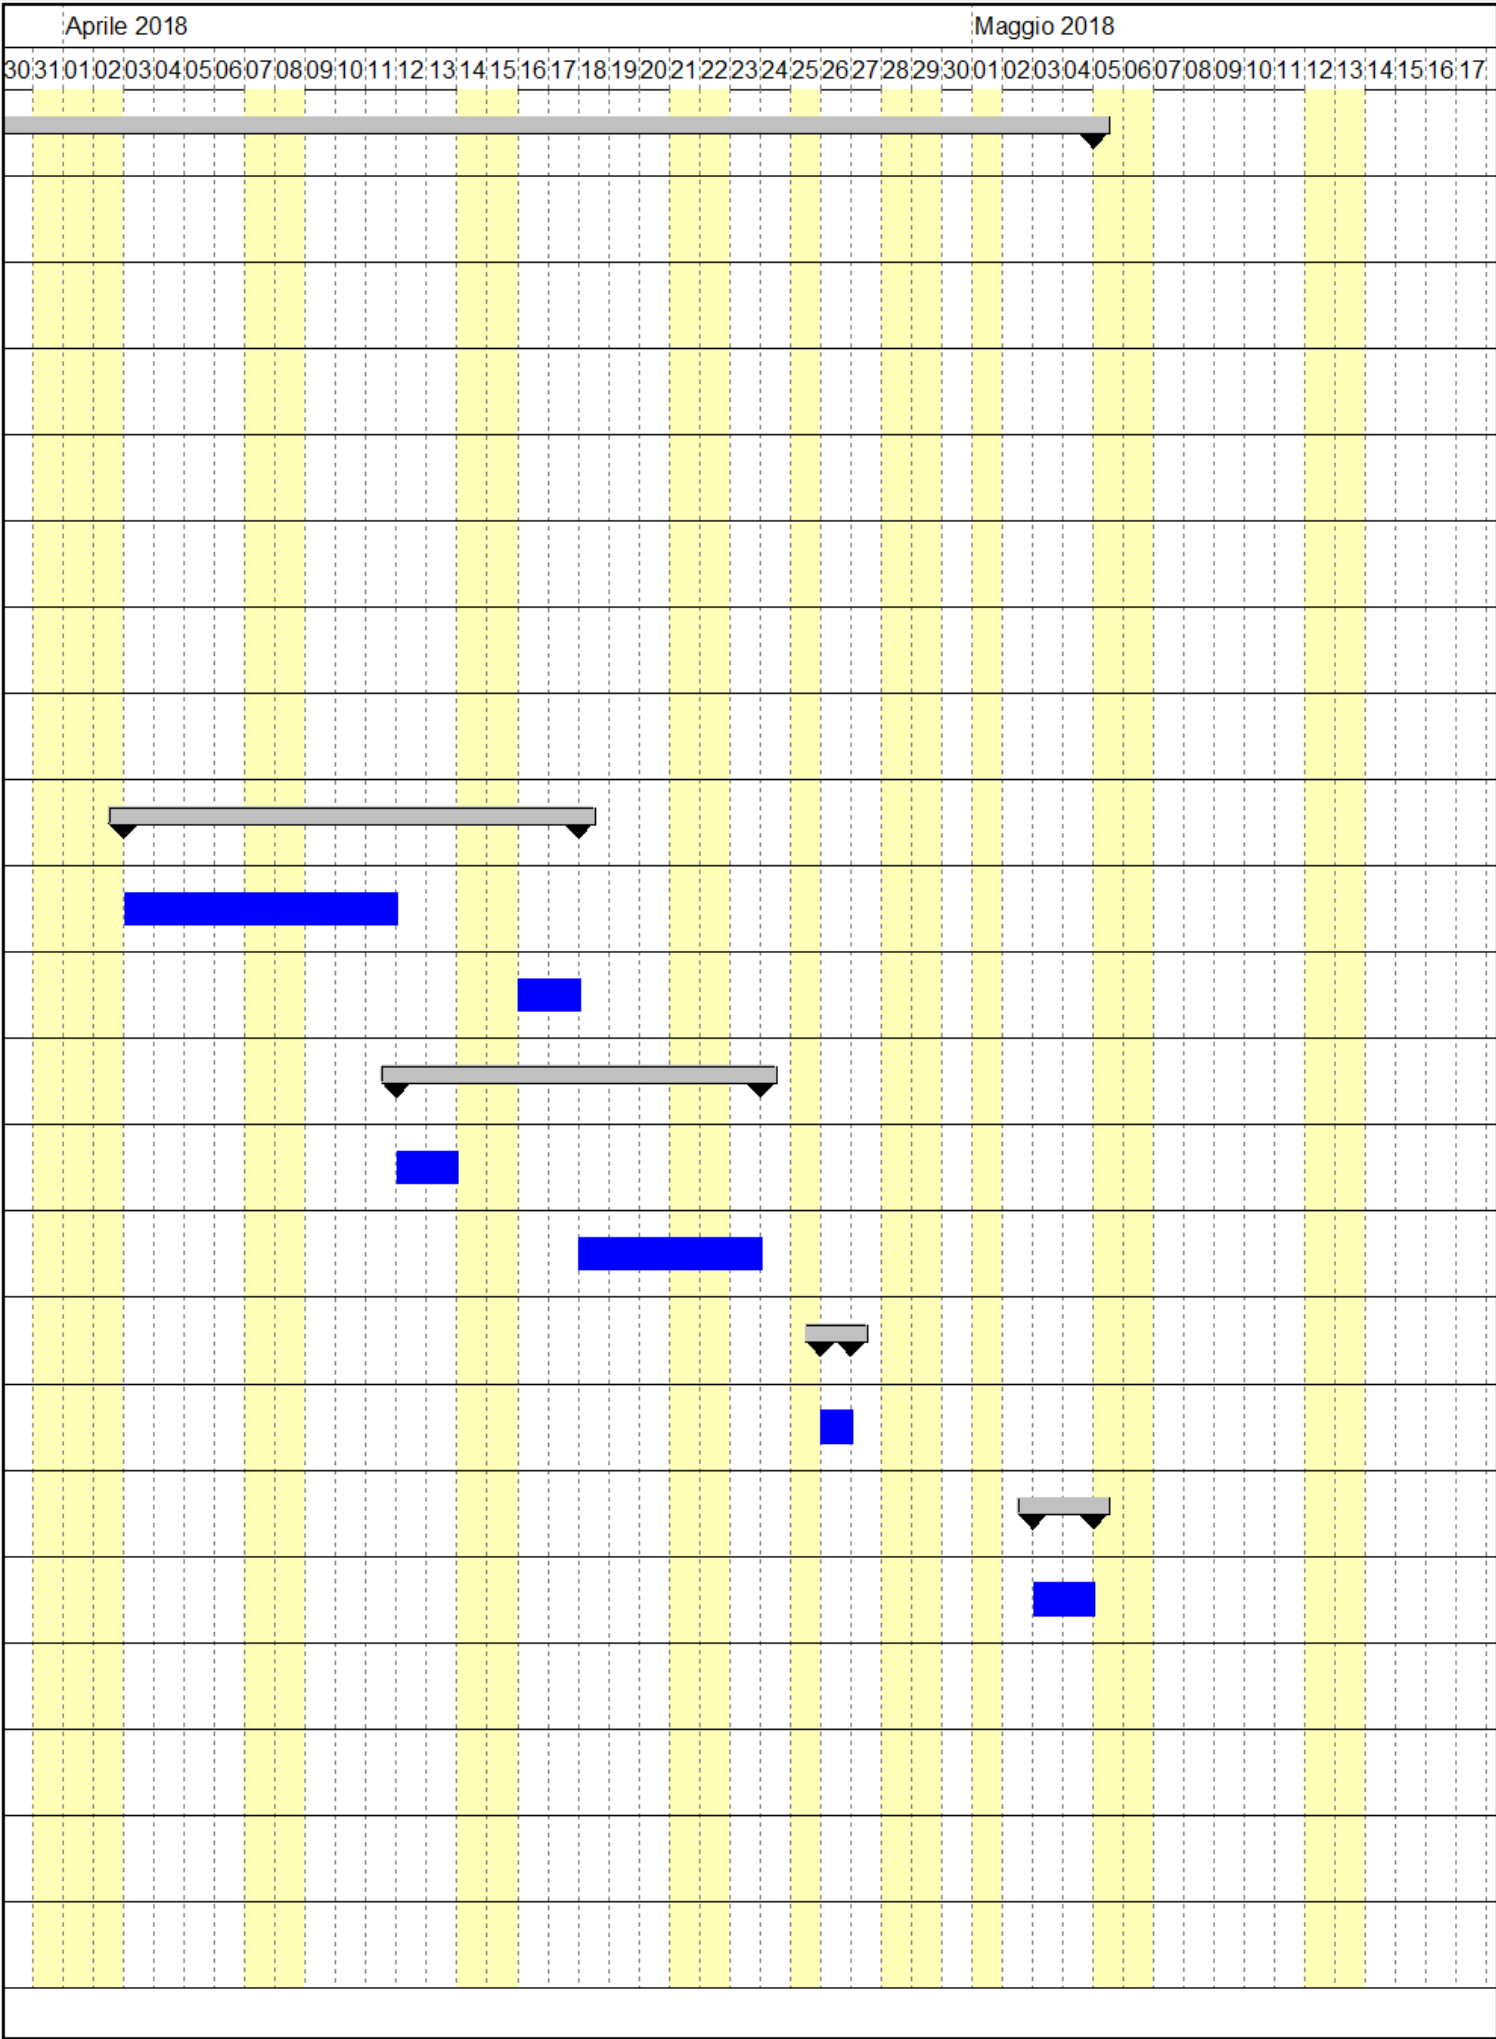

**Comune di MIRA**

**Provincia di VENEZIA**

## **Tabella Attività**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'APERTO PRESSO LA  
SCUOLA DE AMICIS DI MARANO DI MIRA (VE)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MIRA

San Fior (TV), 20/11/2017

Il Tecnico  
(Dott. Arch. Ruzzene Francesca)

---

| ATTIVITA'                                                                           | PREVISTO         |                | Inizio            | Fine              | GIORNI    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | euro             | (%)            |                   |                   | Lav.      | Tot.      |
| <b>Lavori a CORPO</b>                                                               | <b>75'212,12</b> | <b>100,000</b> | <b>01/03/2018</b> | <b>04/05/2018</b> | <b>44</b> | <b>65</b> |
| <b>* ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,000</b>   | <b>01/03/2018</b> | <b>09/03/2018</b> | <b>7</b>  | <b>9</b>  |
| * * Allestimenti vari                                                               | 0,00             | 0,000          | 01/03/2018        | 09/03/2018        | 7         | 9         |
| <b>* DEMOLIZIONI</b>                                                                | <b>12'192,00</b> | <b>16,210</b>  | <b>12/03/2018</b> | <b>14/03/2018</b> | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| * * DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI                                                   | 12'192,00        | 16,210         | 12/03/2018        | 14/03/2018        | 3         | 3         |
| <b>* SCAVI - RILEVATI</b>                                                           | <b>9'622,70</b>  | <b>12,794</b>  | <b>15/03/2018</b> | <b>23/03/2018</b> | <b>7</b>  | <b>9</b>  |
| * * SCAVO DI SBANCAMENTO                                                            | 1'598,40         | 2,125          | 15/03/2018        | 16/03/2018        | 2         | 2         |
| * * RIPORTI IN MATERIALE                                                            | 8'024,30         | 10,669         | 19/03/2018        | 23/03/2018        | 5         | 5         |
| <b>* VARIE</b>                                                                      | <b>5'352,42</b>  | <b>7,116</b>   | <b>03/04/2018</b> | <b>17/04/2018</b> | <b>11</b> | <b>15</b> |
| * * FORMAZIONE CORDOLO, PLINTO IN C.A.                                              | 4'501,02         | 5,984          | 03/04/2018        | 11/04/2018        | 7         | 9         |
| * * TAPPETO ERBOSO                                                                  | 851,40           | 1,132          | 16/04/2018        | 17/04/2018        | 2         | 2         |
| <b>* PAVIMENTAZIONI</b>                                                             | <b>45'145,00</b> | <b>60,024</b>  | <b>12/04/2018</b> | <b>23/04/2018</b> | <b>8</b>  | <b>12</b> |
| * * PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO                                                  | 24'169,00        | 32,134         | 12/04/2018        | 13/04/2018        | 2         | 2         |
| * * RIVESTIMENTO ELASTICO PAVIMENTAZIONI                                            | 20'976,00        | 27,889         | 18/04/2018        | 23/04/2018        | 4         | 6         |
| <b>* SEGNALETICA</b>                                                                | <b>2'900,00</b>  | <b>3,856</b>   | <b>26/04/2018</b> | <b>26/04/2018</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| * * SEGNALETICA                                                                     | 2'900,00         | 3,856          | 26/04/2018        | 26/04/2018        | 1         | 1         |
| <b>* SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,000</b>   | <b>03/05/2018</b> | <b>04/05/2018</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| * * Chiusura cantiere                                                               | 0,00             | 0,000          | 03/05/2018        | 04/05/2018        | 2         | 2         |
| San Fior (TV), 20/11/2017                                                           |                  |                |                   |                   |           |           |
| <p style="text-align: center;"><b>Tecnico</b><br/>Dott. Arch. Ruzzene Francesca</p> |                  |                |                   |                   |           |           |

**Comune di MIRA**

**Provincia di VENEZIA**

# **Tabella Date e Importi**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'APERTO PRESSO LA  
SCUOLA DE AMICIS DI MARANO DI MIRA (VE)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MIRA

San Fior (TV), 20/11/2017

Il Tecnico  
(Dott. Arch. Ruzzene Francesca)

---

| DATA                                            | IMPORTI PREVISTI |                     |         |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------|
|                                                 | Parziale<br>euro | Progressivo<br>euro | (%)     |
| 12/03/2018                                      | 4'064,00         | 4'064,00            | 5,403   |
| 13/03/2018                                      | 4'064,00         | 8'128,00            | 10,807  |
| 14/03/2018                                      | 4'064,00         | 12'192,00           | 16,210  |
| 15/03/2018                                      | 799,20           | 12'991,20           | 17,273  |
| 16/03/2018                                      | 799,20           | 13'790,40           | 18,335  |
| 19/03/2018                                      | 1'604,86         | 15'395,26           | 20,469  |
| 20/03/2018                                      | 1'604,86         | 17'000,12           | 22,603  |
| 21/03/2018                                      | 1'604,86         | 18'604,98           | 24,737  |
| 22/03/2018                                      | 1'604,86         | 20'209,84           | 26,870  |
| 23/03/2018                                      | 1'604,86         | 21'814,70           | 29,004  |
| 03/04/2018                                      | 643,00           | 22'457,70           | 29,859  |
| 04/04/2018                                      | 643,00           | 23'100,71           | 30,714  |
| 05/04/2018                                      | 643,00           | 23'743,71           | 31,569  |
| 06/04/2018                                      | 643,00           | 24'386,71           | 32,424  |
| 09/04/2018                                      | 643,00           | 25'029,71           | 33,279  |
| 10/04/2018                                      | 643,00           | 25'672,72           | 34,134  |
| 11/04/2018                                      | 643,00           | 26'315,72           | 34,989  |
| 12/04/2018                                      | 12'084,50        | 38'400,22           | 51,056  |
| 13/04/2018                                      | 12'084,50        | 50'484,72           | 67,123  |
| 16/04/2018                                      | 425,70           | 50'910,42           | 67,689  |
| 17/04/2018                                      | 425,70           | 51'336,12           | 68,255  |
| 18/04/2018                                      | 5'244,00         | 56'580,12           | 75,227  |
| 19/04/2018                                      | 5'244,00         | 61'824,12           | 82,200  |
| 20/04/2018                                      | 5'244,00         | 67'068,12           | 89,172  |
| 23/04/2018                                      | 5'244,00         | 72'312,12           | 96,144  |
| 26/04/2018                                      | 2'900,00         | 75'212,12           | 100,000 |
| San Fior (TV), 20/11/2017                       |                  |                     |         |
| <b>Tecnico</b><br>Dott. Arch. Ruzzene Francesca |                  |                     |         |
